

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «11» ноября 2022 г. по «17» ноября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022

(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Розы Люксембург дом 13

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/срок и	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/срок и	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	Ремонт крыши 77%	-	-	30.11.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо,
ул. Розы Люксембург, Многоквартирный дом № 13

ВИД(Ы) РАБОТ: РЕМОНТ КРЫШИ

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru


ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович

СУБПОДРЯДЧИК:
Васильев Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: 06.07.2022 г.
Окончание работ: 30.11.2022 г.

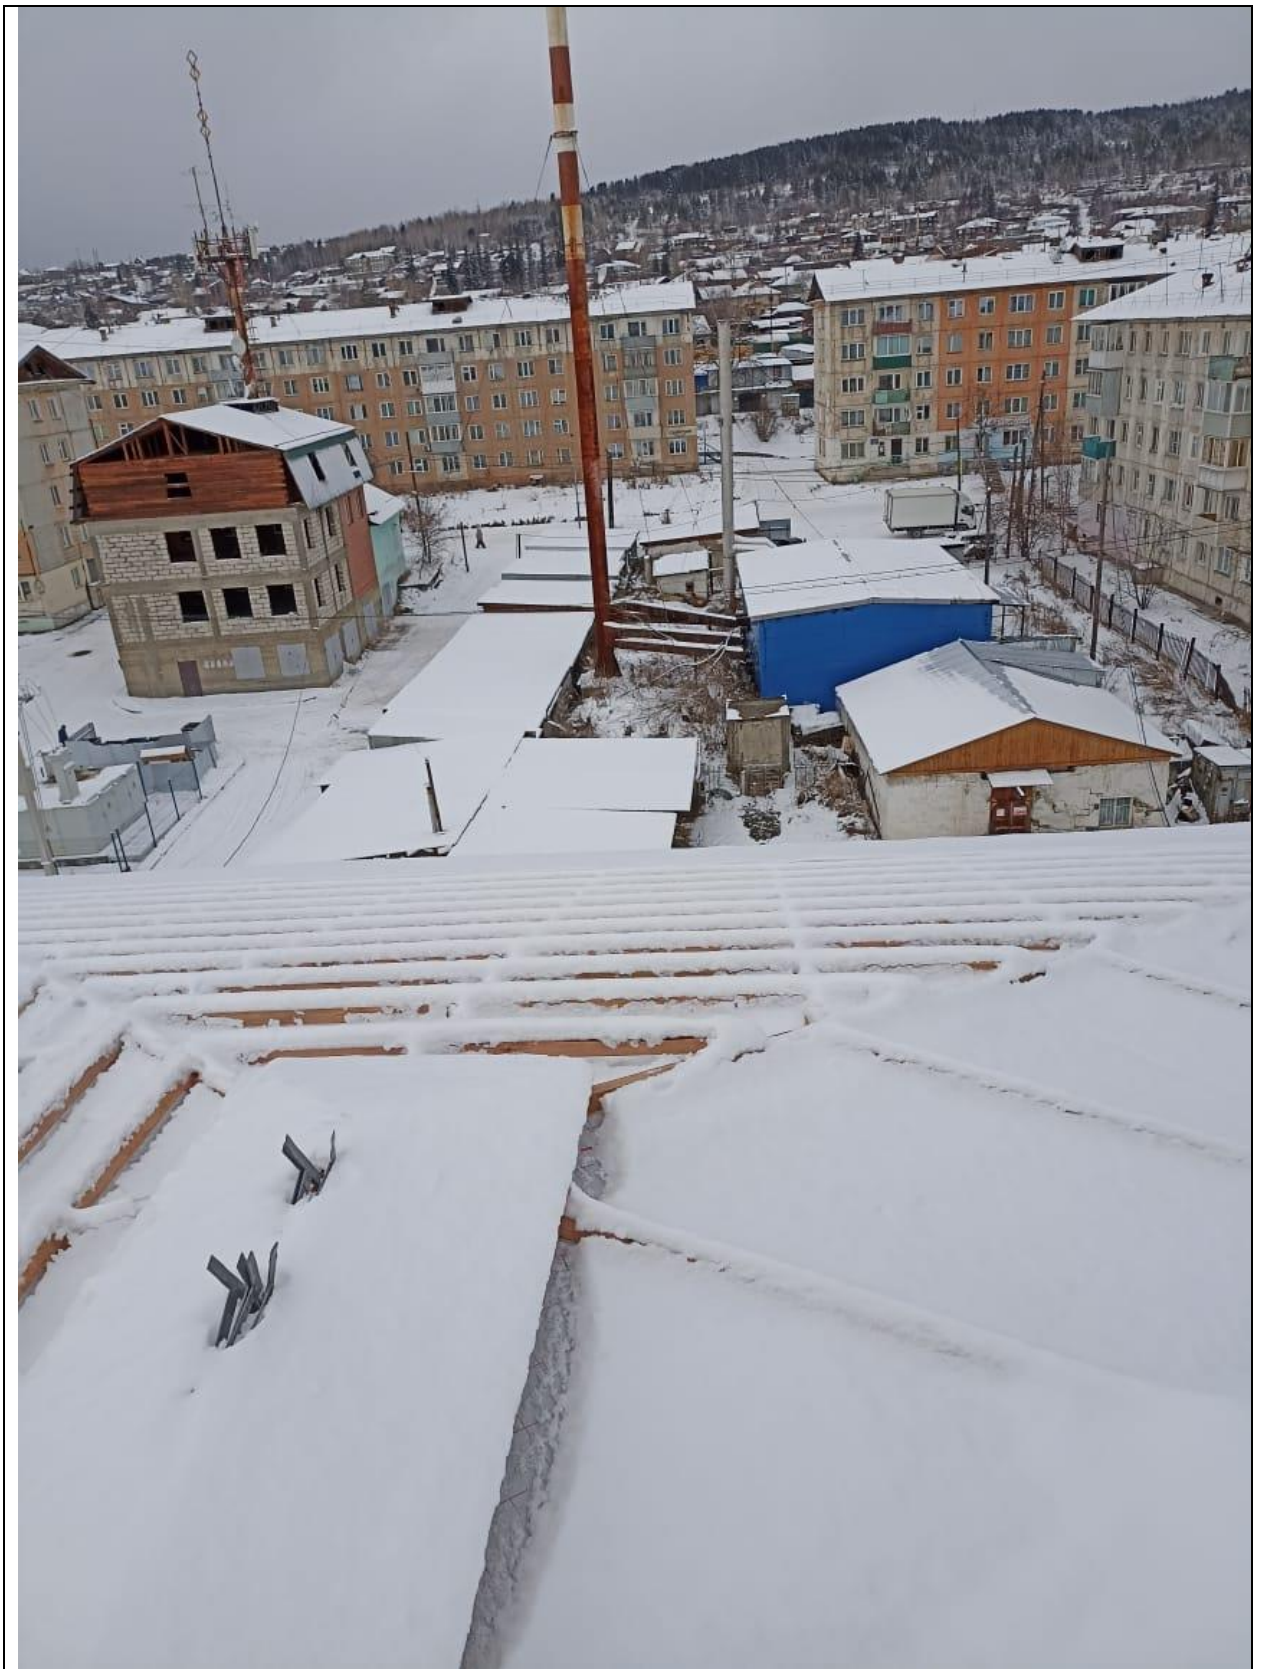

2/13

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, имя, подпись уполномоченного представителя исполнителя
50	19.10.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
51	21.10.22	Монтаж сэндвича по периметру	Смирнов А.А.
52	23.10.22	Монтаж сэндвича по периметру	Смирнов А.А.
53	25.10.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
54	27.10.22	Монтаж сэндвича по периметру кровли	Смирнов А.А.
55	29.10.22	Устройство пароизоляции по кровле	Смирнов А.А.
56	31.10.22	Устройство пароизоляции по кровле	Смирнов А.А.
57	02.11.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
58	04.11.22	Устройство пароизоляции по кровле	Смирнов А.А.
59	06.11.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
60	08.11.22	Устройство пароизоляции по кровле	Смирнов А.А.
61	10.11.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
62	12.11.22	Устройство пароизоляции по кровле	Смирнов А.А.
63	14.11.22	Устройство обрешетки по кровле	Смирнов А.А.
64	16.11.22	Устройство стропильной системы	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

