

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «04» ноября 2022 г. по «11» ноября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022

(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 17

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	21.03.2022	Ремонт крыши 100%	-	-	15.09.2022	-
2	Капитальный ремонт ХВС	06.05.2022	Ремонт ХВС 95 %	-	-	15.09.2022	-
3	Капитальный ремонт ГВС	06.05.2022	Ремонт ГВС 95 %	-	-	15.09.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,
Многоквартирный дом № 17

ВИД(Ы) РАБОТ: ремонт внутридомовых инженерных
систем водоснабжения (холодного и горячего), ремонт
крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121

Сайт: www.fkr38.ru,

Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:


Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЪЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович

Ответственный: Васильев
Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: «08».04.2022 г.

Окончание работ: 15.09.2022 г.

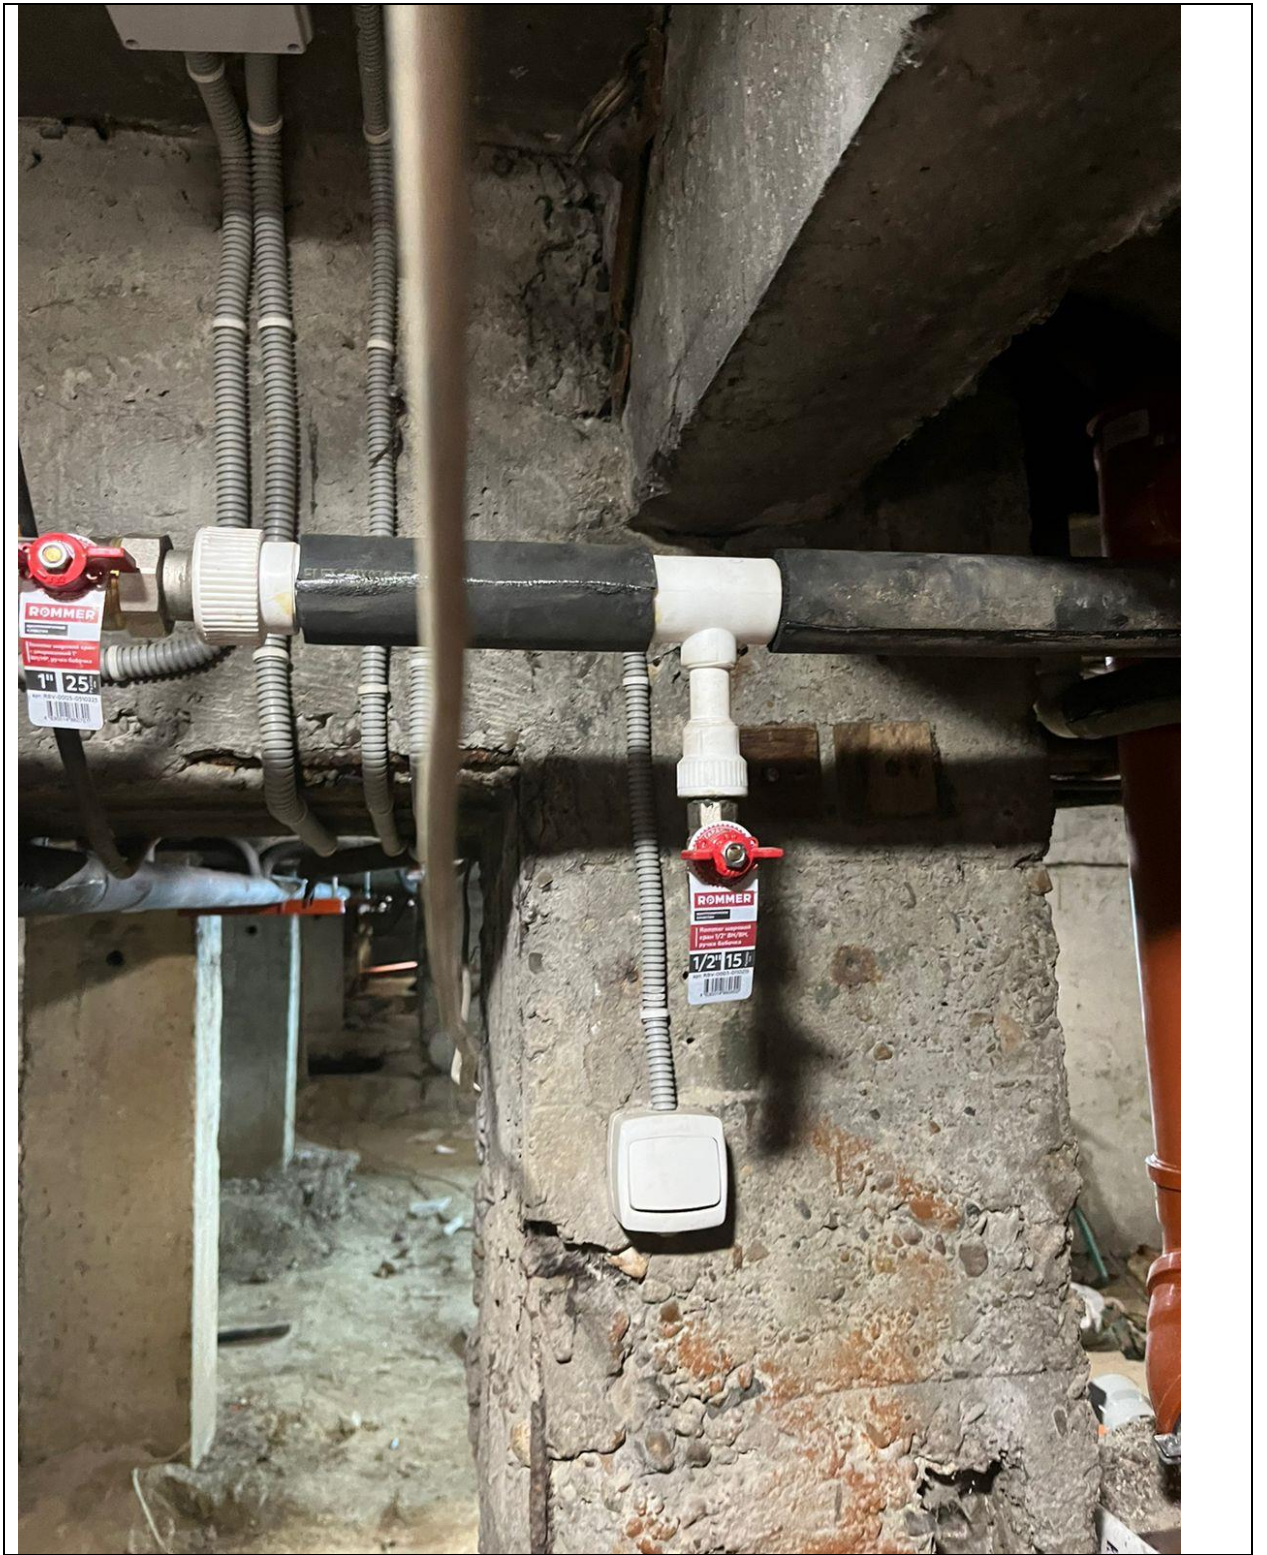

u 17

[illegible]

Исполнитель

А.А. Смирнов



[Handwritten signature in blue ink]
