

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «02» декабря 2022 г. по «08» декабря 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022

(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы дом 5

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	09.08.2022	Ремонт крыши 85 %	Приостановка работ (погодные явления)	-	15.09.2022	Срок окончания работ продлевается до 25.12.2022

Приложение:



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. 30 лет
Победы, Многоквартирный дом № 5

ВИД(Ы) РАБОТ: ремонт крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области


Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФДЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович
Ответственный: Васильев
Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: «02».08.2022 г.
Окончание работ: 01.09.2022 г.

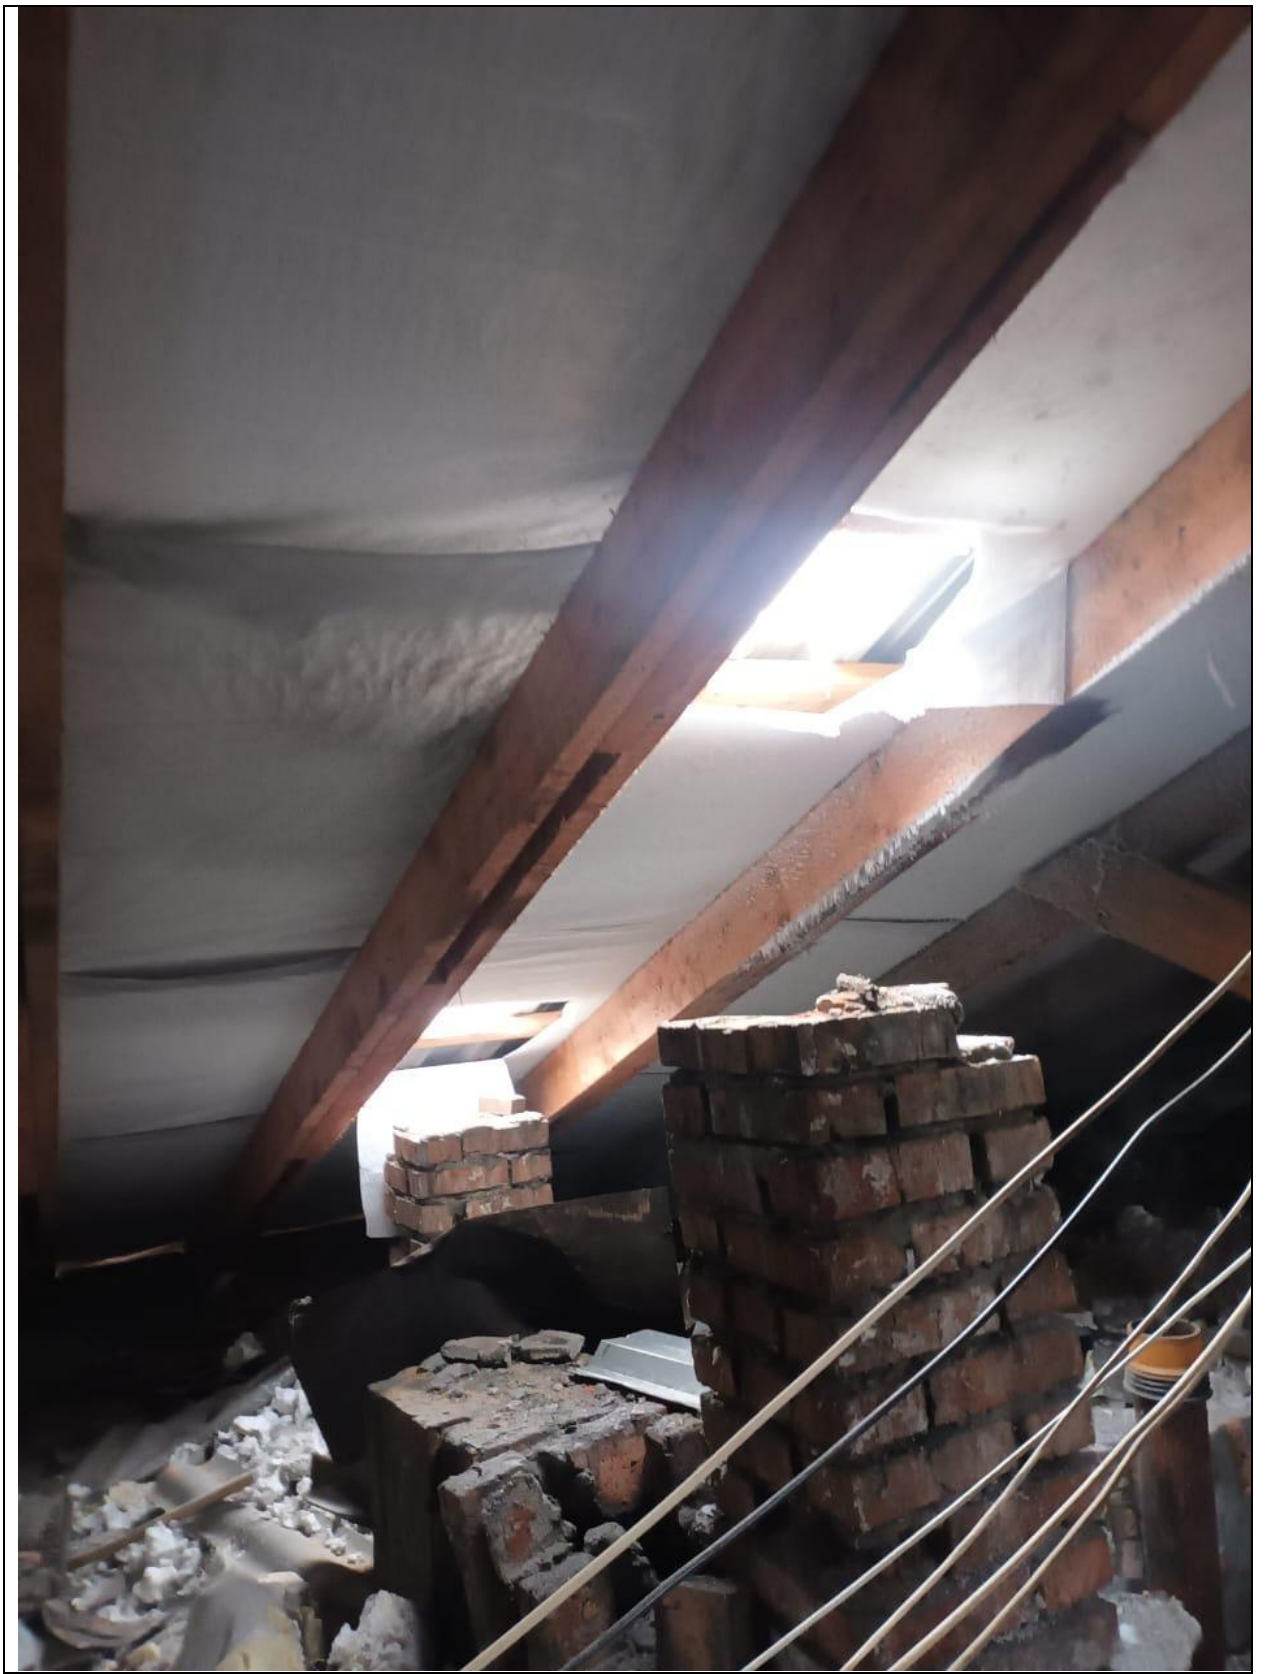

Зонек 5			
№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, имя, подпись уполномоченного представителя, осуществляющего строительство
1	2	3	4
49	19.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
50	21.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
51	24.11.22	Устройство пароизоляции на кровле	Смирнов А.А.
52	26.11.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов А.А.
53	28.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
54	30.11.22	Устройство пароизоляции на кровле	Смирнов А.А.
55	02.12.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.
56	04.12.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов А.
57	06.12.22	Устройство пароизоляции на кровле	Смирнов А.
58	08.12.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.

А.А. Смирнов

