

**Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

за период с «21» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022  
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 4А

| № п/п | Вид работ                                 | Дата начала работ/сроки | Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения | Приостановка работ                                                    |                          | Дата завершения работ/сроки | Примечание                        |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|       |                                           |                         |                                                                            | Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено) | Дата возобновления работ |                             |                                   |
| 1     | 2                                         | 3                       | 4                                                                          | 5                                                                     | 6                        | 7                           | 8                                 |
| 1     | Капитальный ремонт крыши                  | 06.07.2022              | <b>Ремонт крыши 56%</b>                                                    | Приостановка работ (погодные явления)                                 | -                        | 15.10.2022                  | Срок окончания работ продлевается |
| 2     | Капитальный ремонт системы теплоснабжения | 06.07.2022              | <b>Ремонт системы теплоснабжения 100%</b>                                  | -                                                                     | -                        | 15.10.2022                  | -                                 |

Приложение:

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**  
**ОБЪЕКТ:** Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,  
Многоквартирный дом № 4А

**ВИД(Ы) РАБОТ:**  
ремонт внутридомовых инженерных  
систем теплоснабжения, ремонт крыши

**ЗАКАЗЧИК:**

Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121

Сайт: [www.fkr38.ru](http://www.fkr38.ru),

Почта: [remont@fkr38.ru](mailto:remont@fkr38.ru)

**ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев


Иван Иванович

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Васильев Василий Сергеевич  
(89501253034)

Начало работ: 06.06.2022 г.

Окончание работ: 30.09.2022 г.

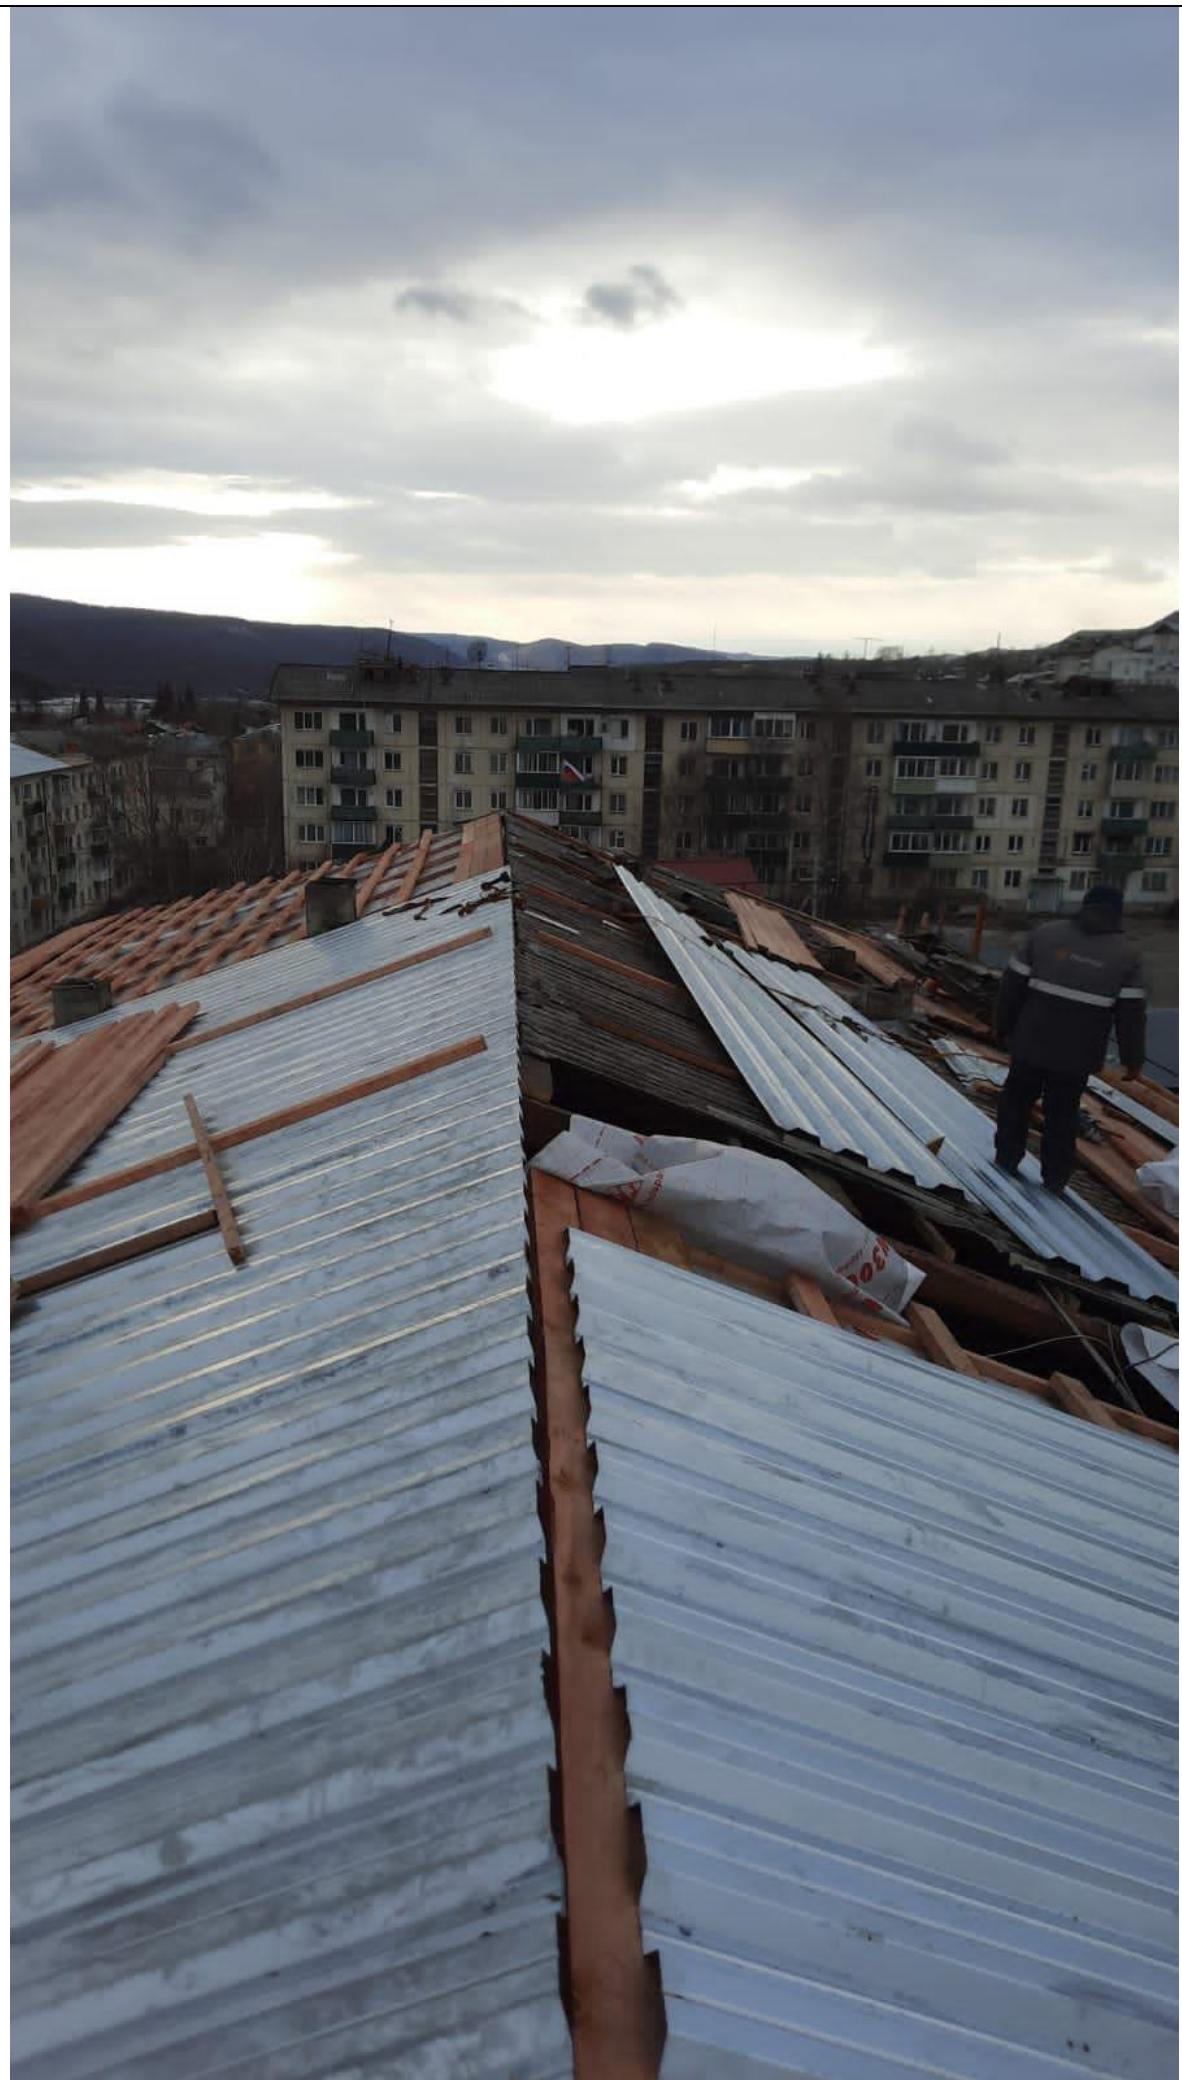



44

| №№/лп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя осуществляющего строитель |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                | 4                                                                                             |
| 46    | 23.09.22              | Устройство обрешетки на кровле                                                                                                   | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 47    | 26.09.22              | Монтаж кровельного настила (профлист)                                                                                            | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 48    | 28.09.22              | Демонтаж кровельного настила                                                                                                     | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 49    | 30.09.22              | Обрешетка на кровлю. Огне-био защитное покрытие                                                                                  | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 50    | 02.10.22              | Устройство цокольной гидроизоляции                                                                                               | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 51    | 04.10.22              | Монтаж кровельного настила (профлист)                                                                                            | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 52    | 06.10.22              | Устройство обрешетки на кровле                                                                                                   | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 53    | 08.10.22              | Монтаж кровельного настила                                                                                                       | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 54    | 10.10.22              | Восстановление штукатурного слоя вент. шахт                                                                                      | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 55    | 12.10.22              | Восстановление штукатурного слоя вент. шахт                                                                                      | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 56    | 14.10.22              | Демонтаж кровельного настила                                                                                                     | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 57    | 16.10.22              | Устройство обрешетки на кровле                                                                                                   | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 58    | 18.10.22              | Монтаж кровельного настила                                                                                                       | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 59    | 20.10.22              | Огне-био защитное покрытие деревянных элементов                                                                                  | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 60    | 22.10.22              | Демонтаж кровельного настила                                                                                                     | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 61    | 24.10.22              | Устройство обрешетки на кровле                                                                                                   | Смирнов А.А.                                                                                  |
| 62    | 26.10.22              | Монтаж кровельного настила                                                                                                       | Смирнов А.А.                                                                                  |

Исполнитель

А.А. Смирнов

