

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «14» октября 2022 г. по «20» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Урицкого дом 4

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	15.03.2022	Ремонт крыши 78%	-	-	15.09.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Урицкого,
Многоквартирный дом № 36

ВИД(Ы) РАБОТ: ремонт внутридомовых инженерных
систем водоснабжения (холодного и горячего), ремонт
крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru


ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович
Ответственный: Васильев
Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: «23» ⁰⁴ .06.2022 г.
Окончание работ: 15.09.2022 г.



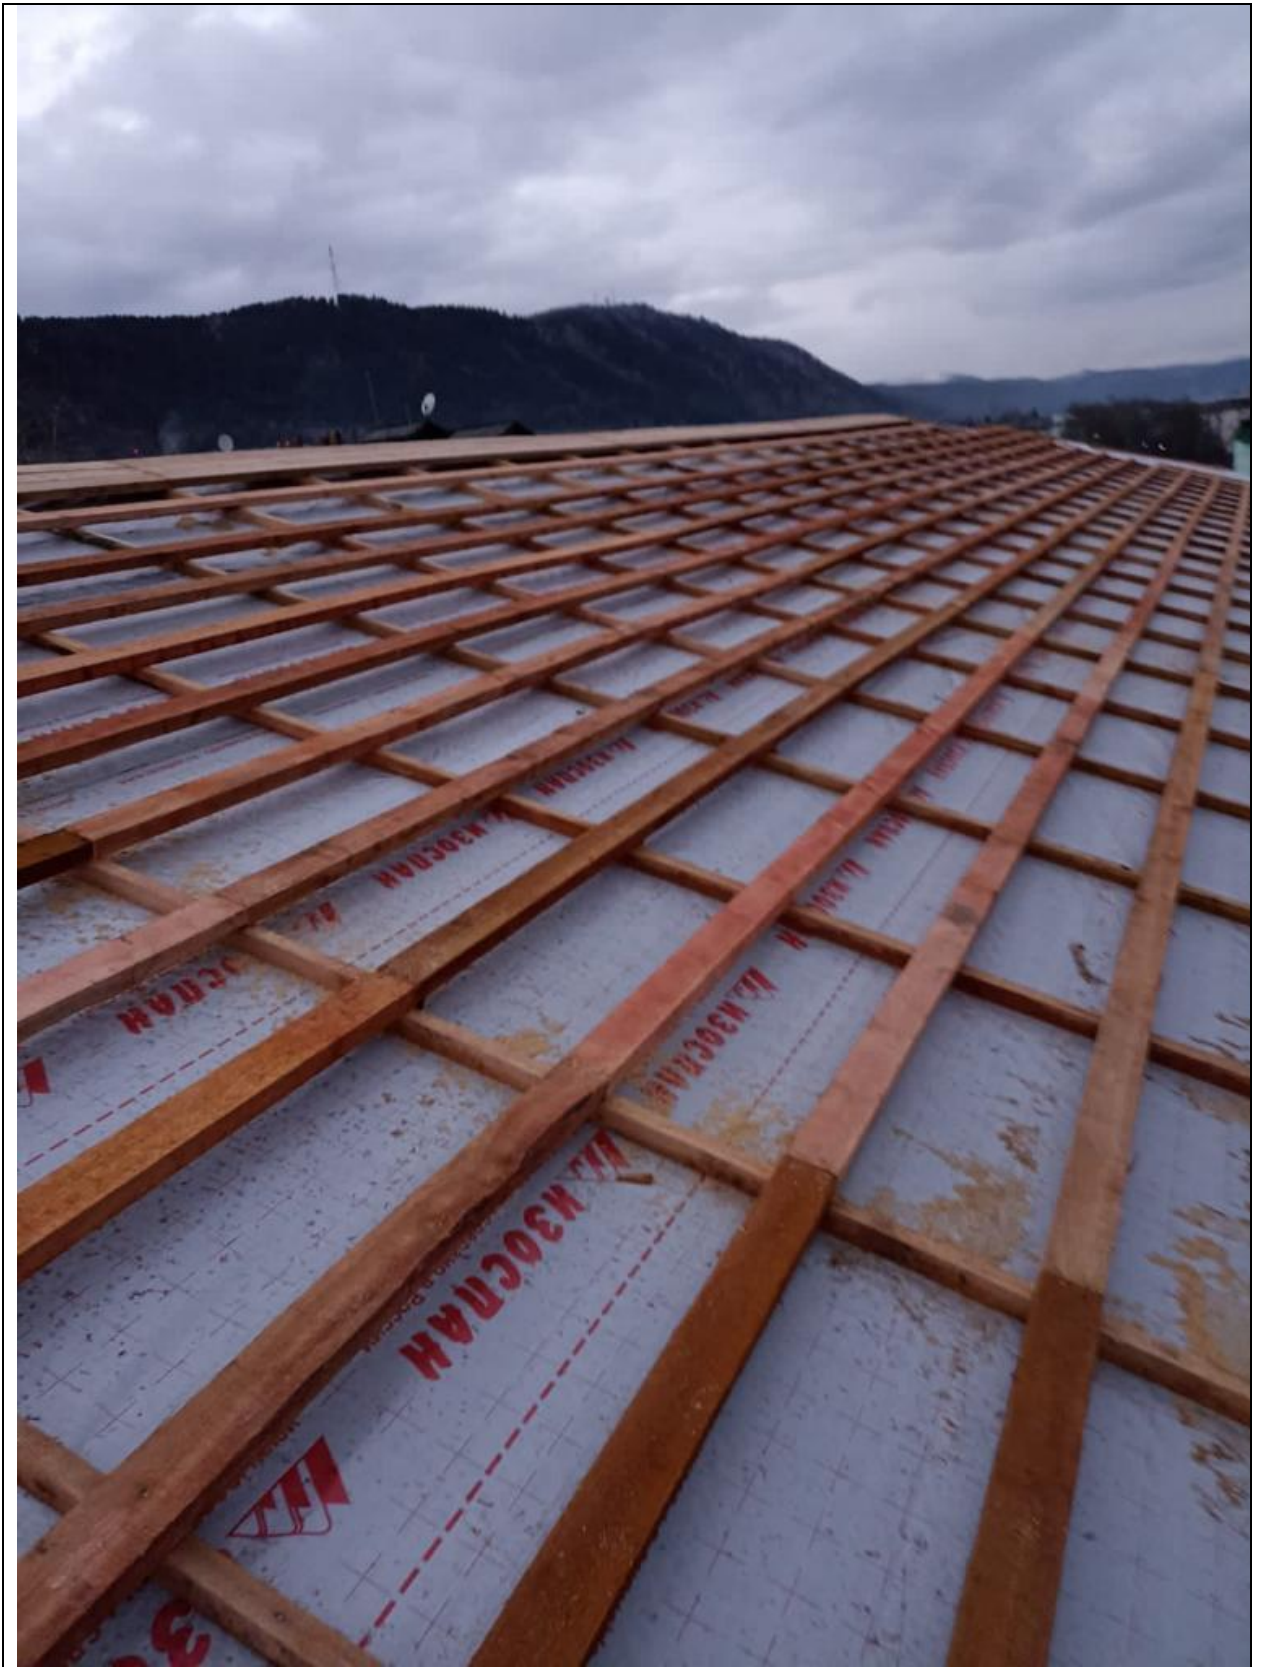

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
63	14.10.22	Монтаж кровельного покрытия на крыше	Смирнов А.А.
64	16.10.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
65	18.10.22	Устройство обрешетки на крыше	Смирнов А.А.
66	20.10.22	Устройство обрешетки на крыше	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

