

**Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

за период с «07» октября 2022 г. по «13» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»  
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022  
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 17

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	21.03.2022	<b>Ремонт крыши 100%</b>	-	-	15.09.2022	-
2	Капитальный ремонт ХВС	06.05.2022	<b>Ремонт ХВС 90 %</b>	-	-	15.09.2022	-
3	Капитальный ремонт ГВС	06.05.2022	<b>Ремонт ГВС 90 %</b>	-	-	15.09.2022	-

Приложение:

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**  
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,  
Многоквартирный дом № 17

**ВИД(Ы) РАБОТ:** ремонт внутридомовых инженерных  
систем водоснабжения (холодного и горячего), ремонт  
крыши

**ЗАКАЗЧИК:**

Фонд капитального  
ремонта многоквартирных  
домов Иркутской области


Тел. 8(3952) 280-121  
Сайт: [www.fkr38.ru](http://www.fkr38.ru),  
Почта: [remont@fkr38.ru](mailto:remont@fkr38.ru)

**ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПРОФАЛЪЯНС»

Руководитель: Андреев  
Иван Иванович  
Ответственный: Васильев  
Василий Сергеевич  
(89501253034)

Начало работ: «08».04.2022 г.  
Окончание работ: 15.09.2022 г.

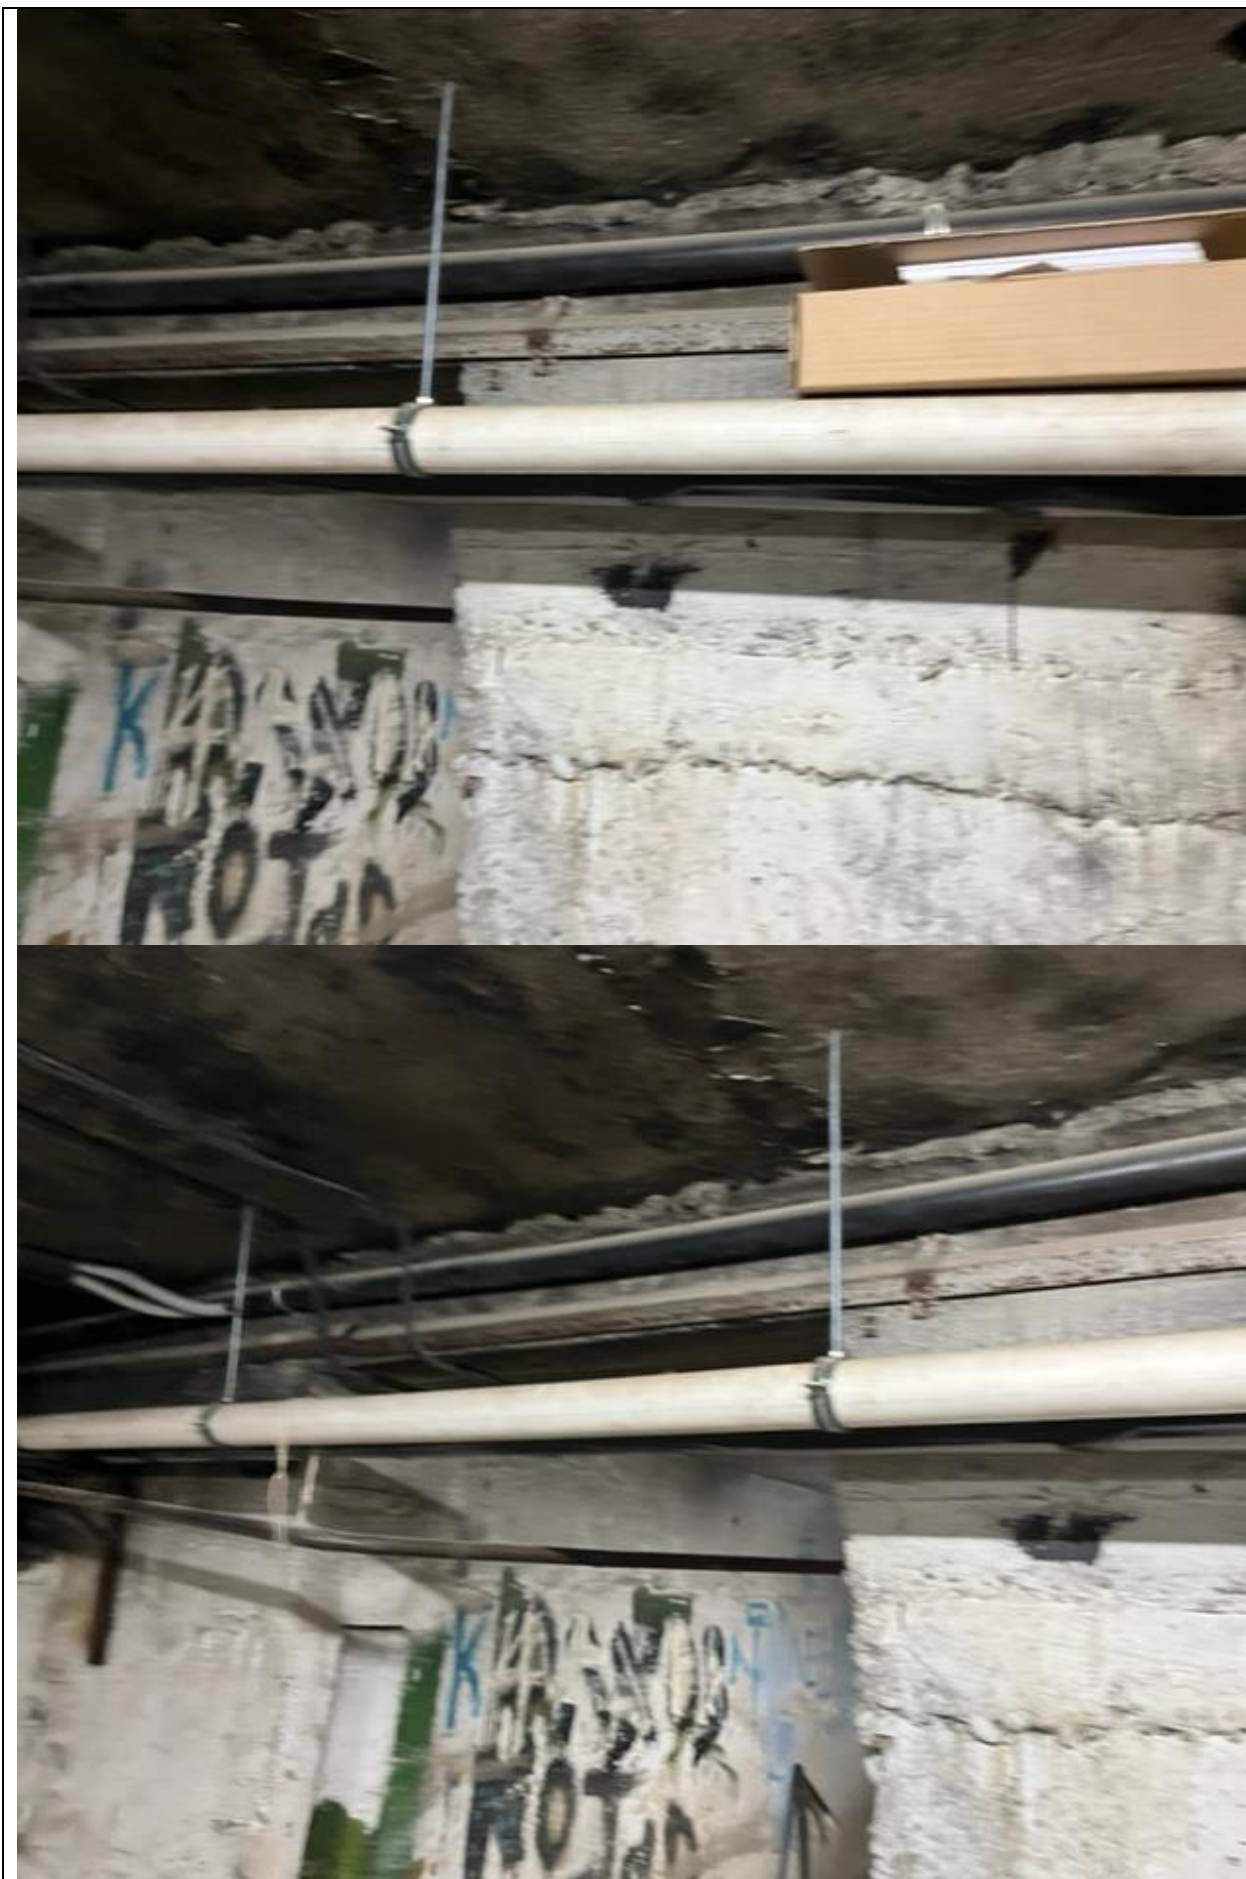

117

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя, осуществляющего строительство
1	2	3	4
67	20.09.22	Демонтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.
68	22.09.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов А.А.
69	24.09.22	Монтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.
70	26.09.22	Демонтаж трубопровода ХВС	Смирнов А.А.
71	28.09.22	Демонтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.
72	30.09.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов А.А.
73	03.10.22	Монтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.
74	05.10.22	Демонтаж трубопровода ХВС	Смирнов А.А.
75	07.10.22	Демонтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.
76	10.10.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов А.А.
77	12.10.22	Монтаж трубопровода ГВС	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

