

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «14» октября 2022 г. по «20» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 17

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	21.03.2022	Ремонт крыши 100%	-	-	15.09.2022	-
2	Капитальный ремонт ХВС	06.05.2022	Ремонт ХВС 92 %	-	-	15.09.2022	-
3	Капитальный ремонт ГВС	06.05.2022	Ремонт ГВС 92 %	-	-	15.09.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,
Многоквартирный дом № 17

ВИД(Ы) РАБОТ: ремонт внутридомовых инженерных
систем водоснабжения (холодного и горячего), ремонт
крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121

Сайт: www.fkr38.ru,

Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:


Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЪЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович

Ответственный: Васильев
Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: «08».04.2022 г.

Окончание работ: 15.09.2022 г.

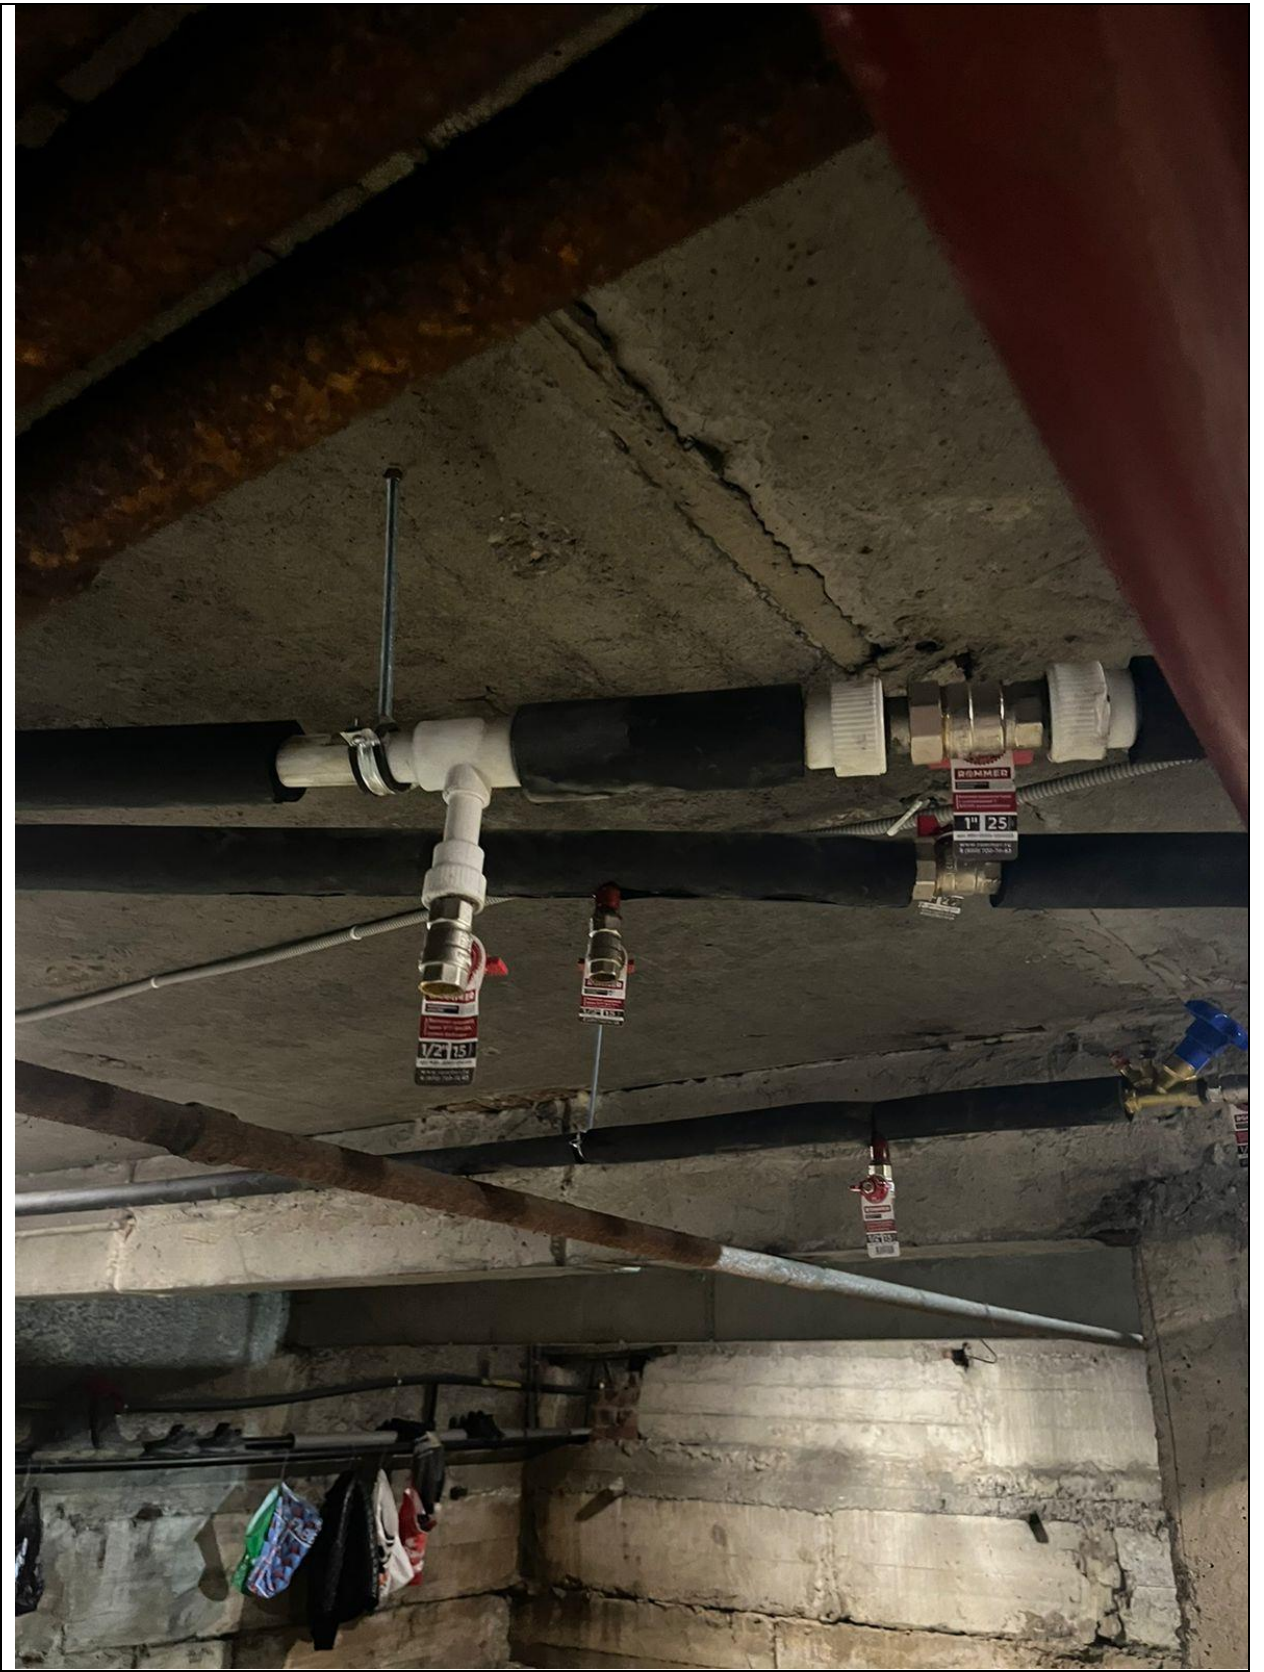



№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Подпись, фамилия, имя, отчество, должность, фамилия, имя, отчество, наименование организации, осуществляющей строительство
67	20.09.22	Демотаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
68	22.09.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
69	24.09.22	Монтаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
70	26.09.22	Демотаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
71	28.09.22	Демотаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
72	30.09.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
73	03.10.22	Монтаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
74	05.10.22	Демотаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
75	07.10.22	Демотаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
76	10.10.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
77	12.10.22	Монтаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
78	14.10.22	Демотаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
79	16.10.22	Демотаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.
80	18.10.22	Монтаж трубопровода ХВС	Смирнов С.С.
81	20.10.22	Монтаж трубопровода РВС	Смирнов С.С.

Исполнитель

А.А. Смирнов

