

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «07» октября 2022 г. по «13» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 4А

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	Ремонт крыши 48%	-	-	15.10.2022	-
2	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	06.07.2022	Ремонт системы теплоснабжения 100%	-	-	15.10.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,
Многоквартирный дом № 4А

ВИД(Ы) РАБОТ:
ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения, ремонт крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:


Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович

СУБПОДРЯДЧИК:

Васильев Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: 06.06.2022 г.
Окончание работ: 30.09.2022 г.

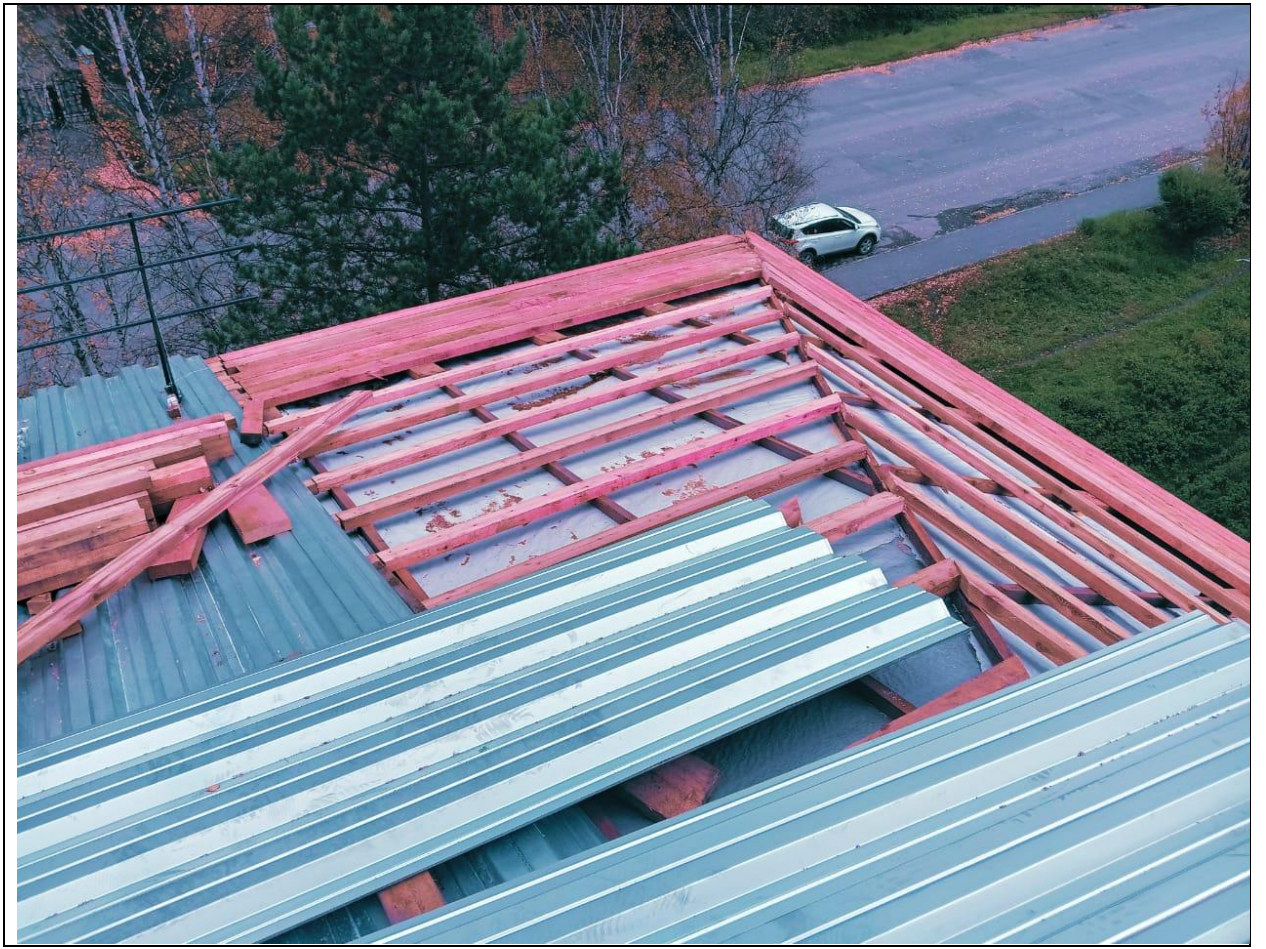

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя осуществляющего строительство
1	2	3	4
16	23.09.22	Устройство обрешетки на кровле	С Смирнов А.А.
47	26.09.22	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	С Смирнов А.А.
48	28.09.22	Демонтаж кровельного покрытия	С Смирнов А.А.
49	30.09.22	Обрешетка на кровлю. Огне-био защитное покрытие	С Смирнов А.А.
50	02.10.22	Устройство цокольной гидроизоляции	С Смирнов А.А.
51	04.10.22	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	С Смирнов А.А.
52	06.10.22	Устройство обрешетки на кровле	С Смирнов А.А.
53	08.10.22	Монтаж кровельного покрытия	С Смирнов А.А.
54	10.10.22	Восстановление штукатурного слоя вет. шахт	С Смирнов А.А.
55	12.10.22	Восстановление штукатурного слоя вет. шахт	С Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

