

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «14» октября 2022 г. по «20» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 4А

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	Ремонт крыши 52%	Приостановка работ (погодные явления)	-	15.10.2022	Срок окончания работ продлевается
2	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	06.07.2022	Ремонт системы теплоснабжения 100%	-	-	15.10.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,
Многоквартирный дом № 4А

ВИД(Ы) РАБОТ:
ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения, ремонт крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:


Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»


Руководитель: Андреев
Иван Иванович

СУБПОДРЯДЧИК:

Васильев Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: 06.06.2022 г.
Окончание работ: 30.09.2022 г.

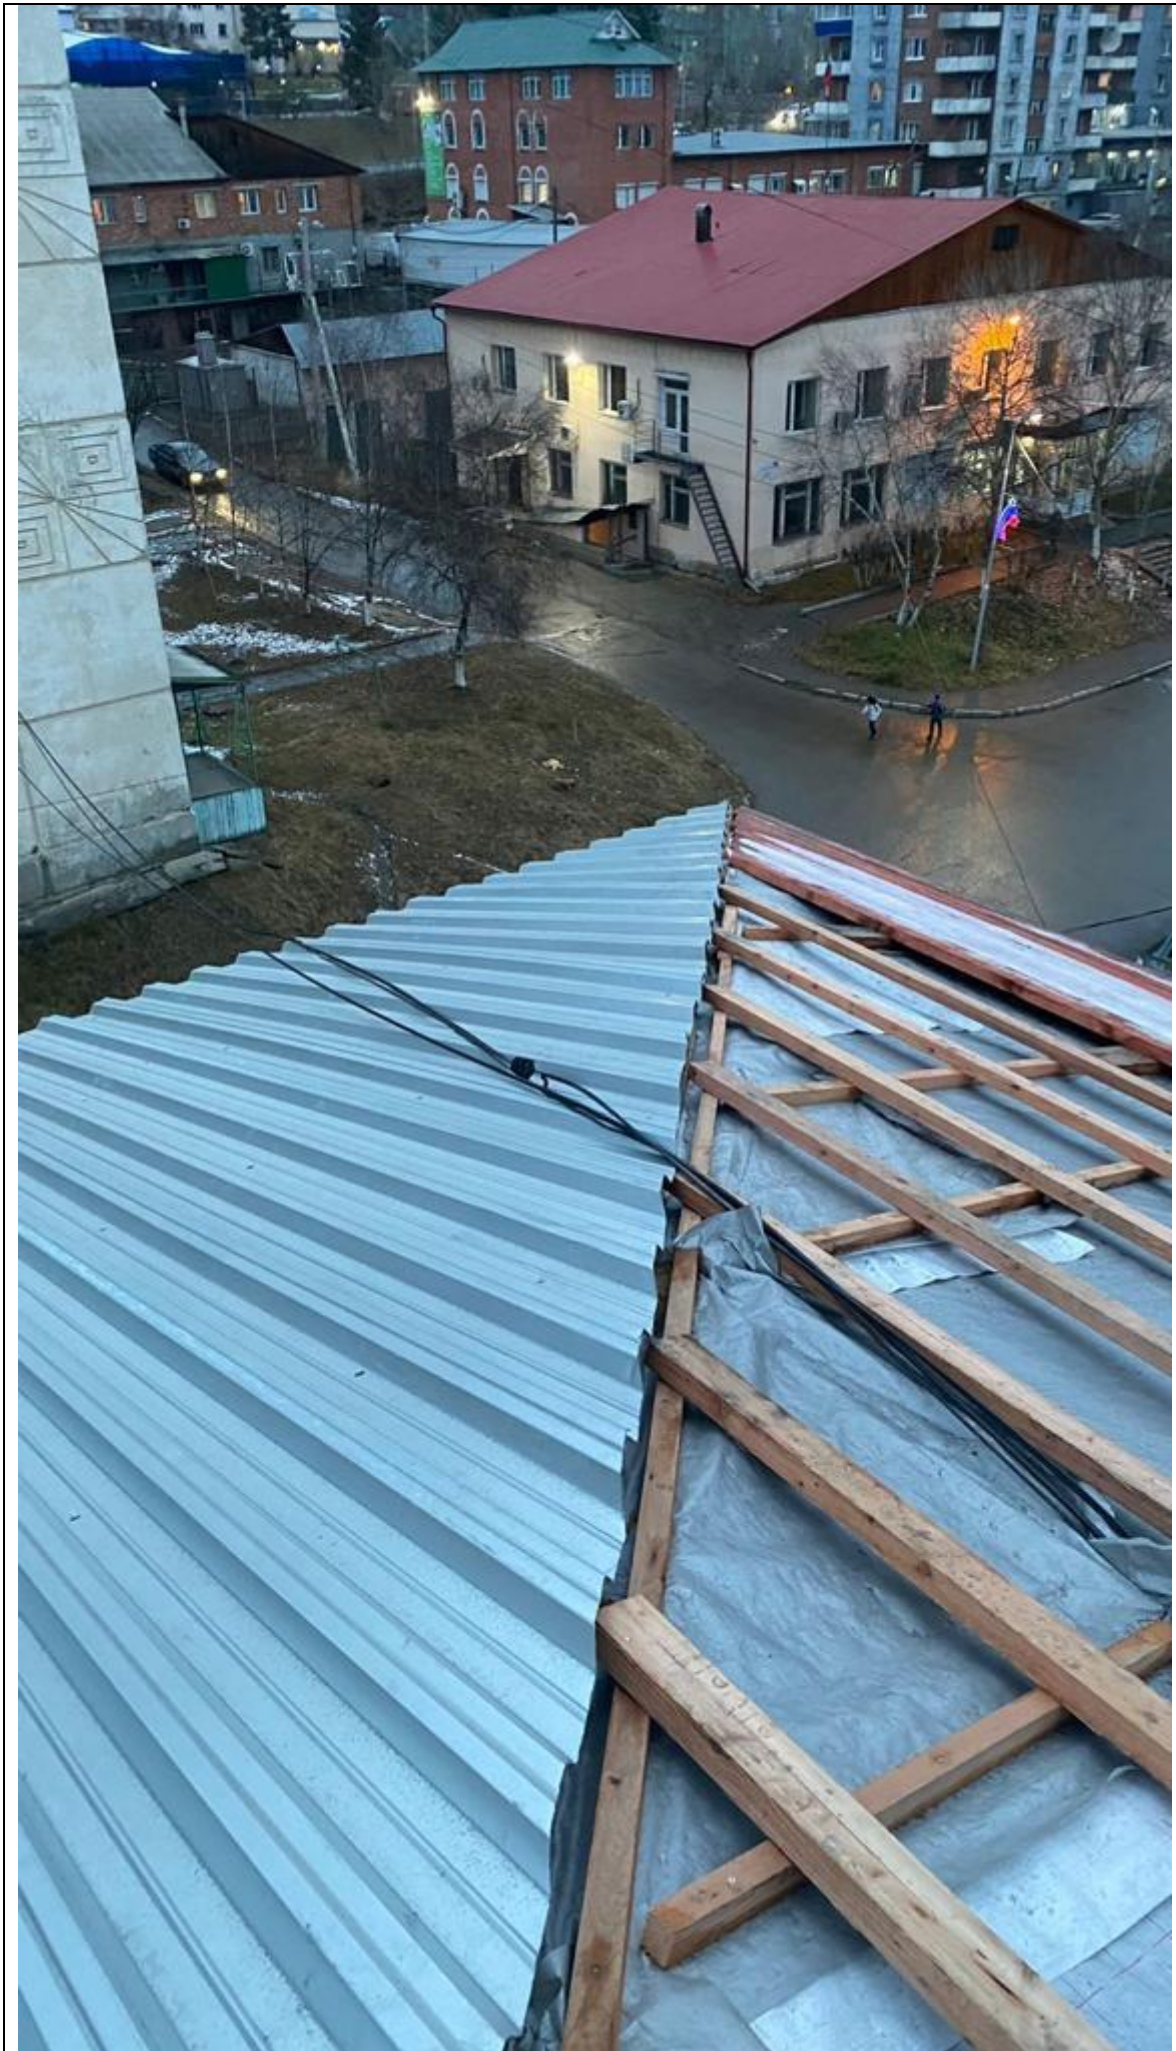

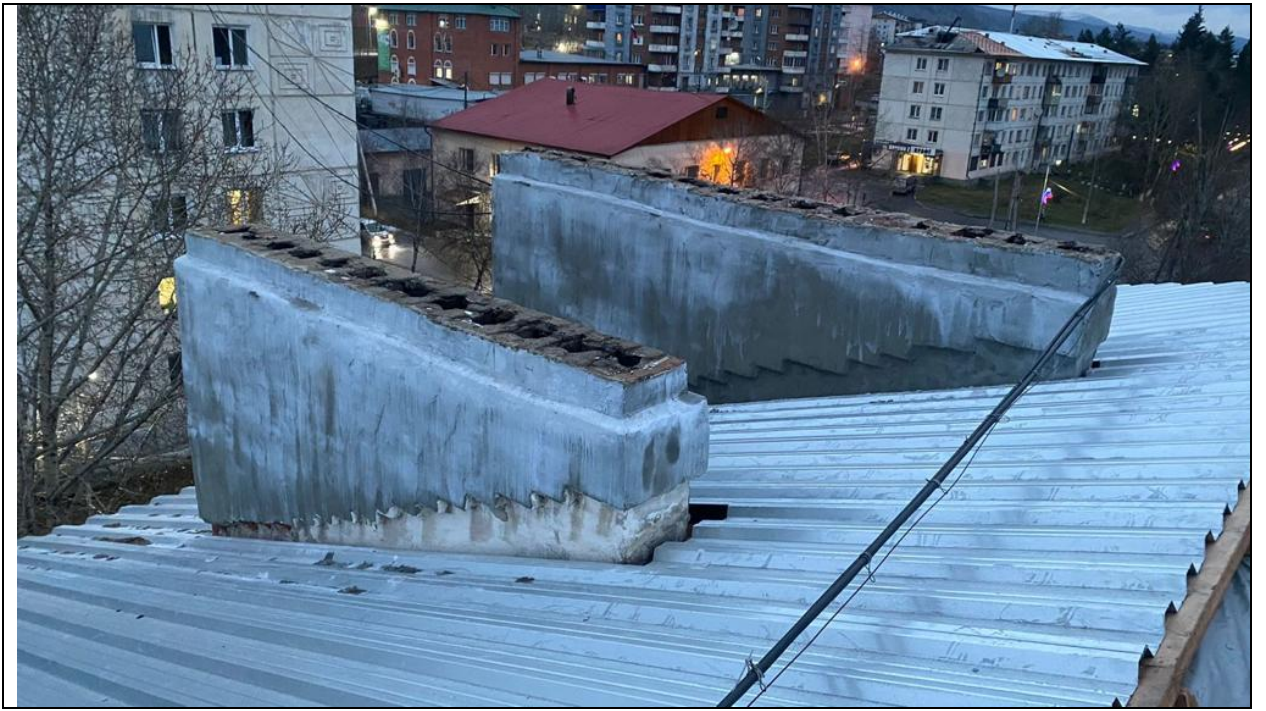

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
46	23.09.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов А.А.
47	26.09.22	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	Смирнов А.А.
48	28.09.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
49	30.09.22	Обрешетка на кровле. Огне-био защитное покрытие	Смирнов А.А.
50	02.10.22	Устройство цокольной гидроизоляции	Смирнов А.А.
51	04.10.22	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	Смирнов А.А.
52	06.10.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов А.А.
53	08.10.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
54	10.10.22	Восстановление штукатурки по слою вет. шпакт.	Смирнов А.А.
55	12.10.22	Восстановление штукатурки по слою вет. шпакт.	Смирнов А.А.
56	14.10.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
57	16.10.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов А.А.
58	18.10.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
59	20.10.22	Огне-био защитное покрытие деревянных элементов	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

