

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «07» октября 2022 г. по «13» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Розы Люксембург дом 13

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	Ремонт крыши 51%	-	-	15.10.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо,
ул. Розы Люксембург, Многоквартирный дом № 13

ВИД(Ы) РАБОТ: РЕМОНТ КРЫШИ

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЪЯНС»


Руководитель: Андреев


Иван Иванович

СУБПОДРЯДЧИК:

Васильев Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: 06.07.2022 г.
Окончание работ: 30.11.2022 г.

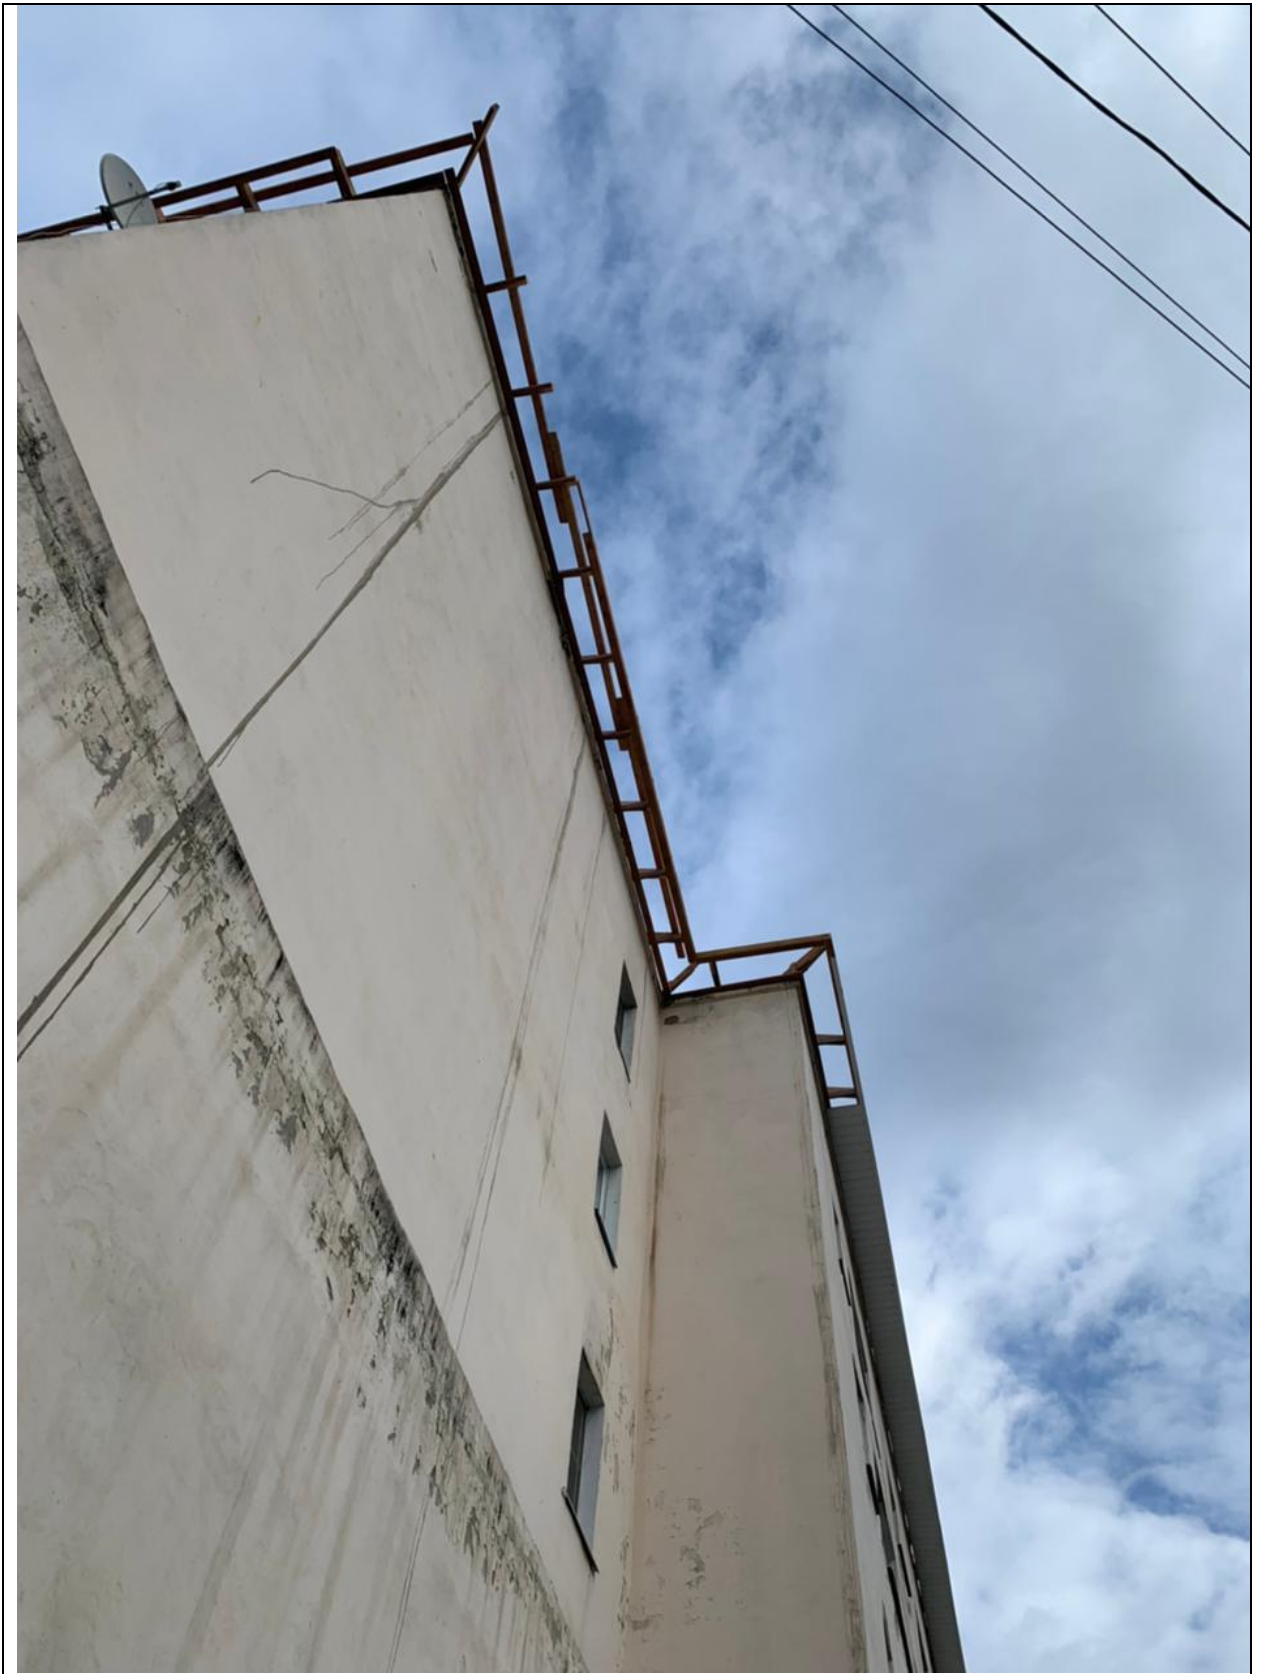

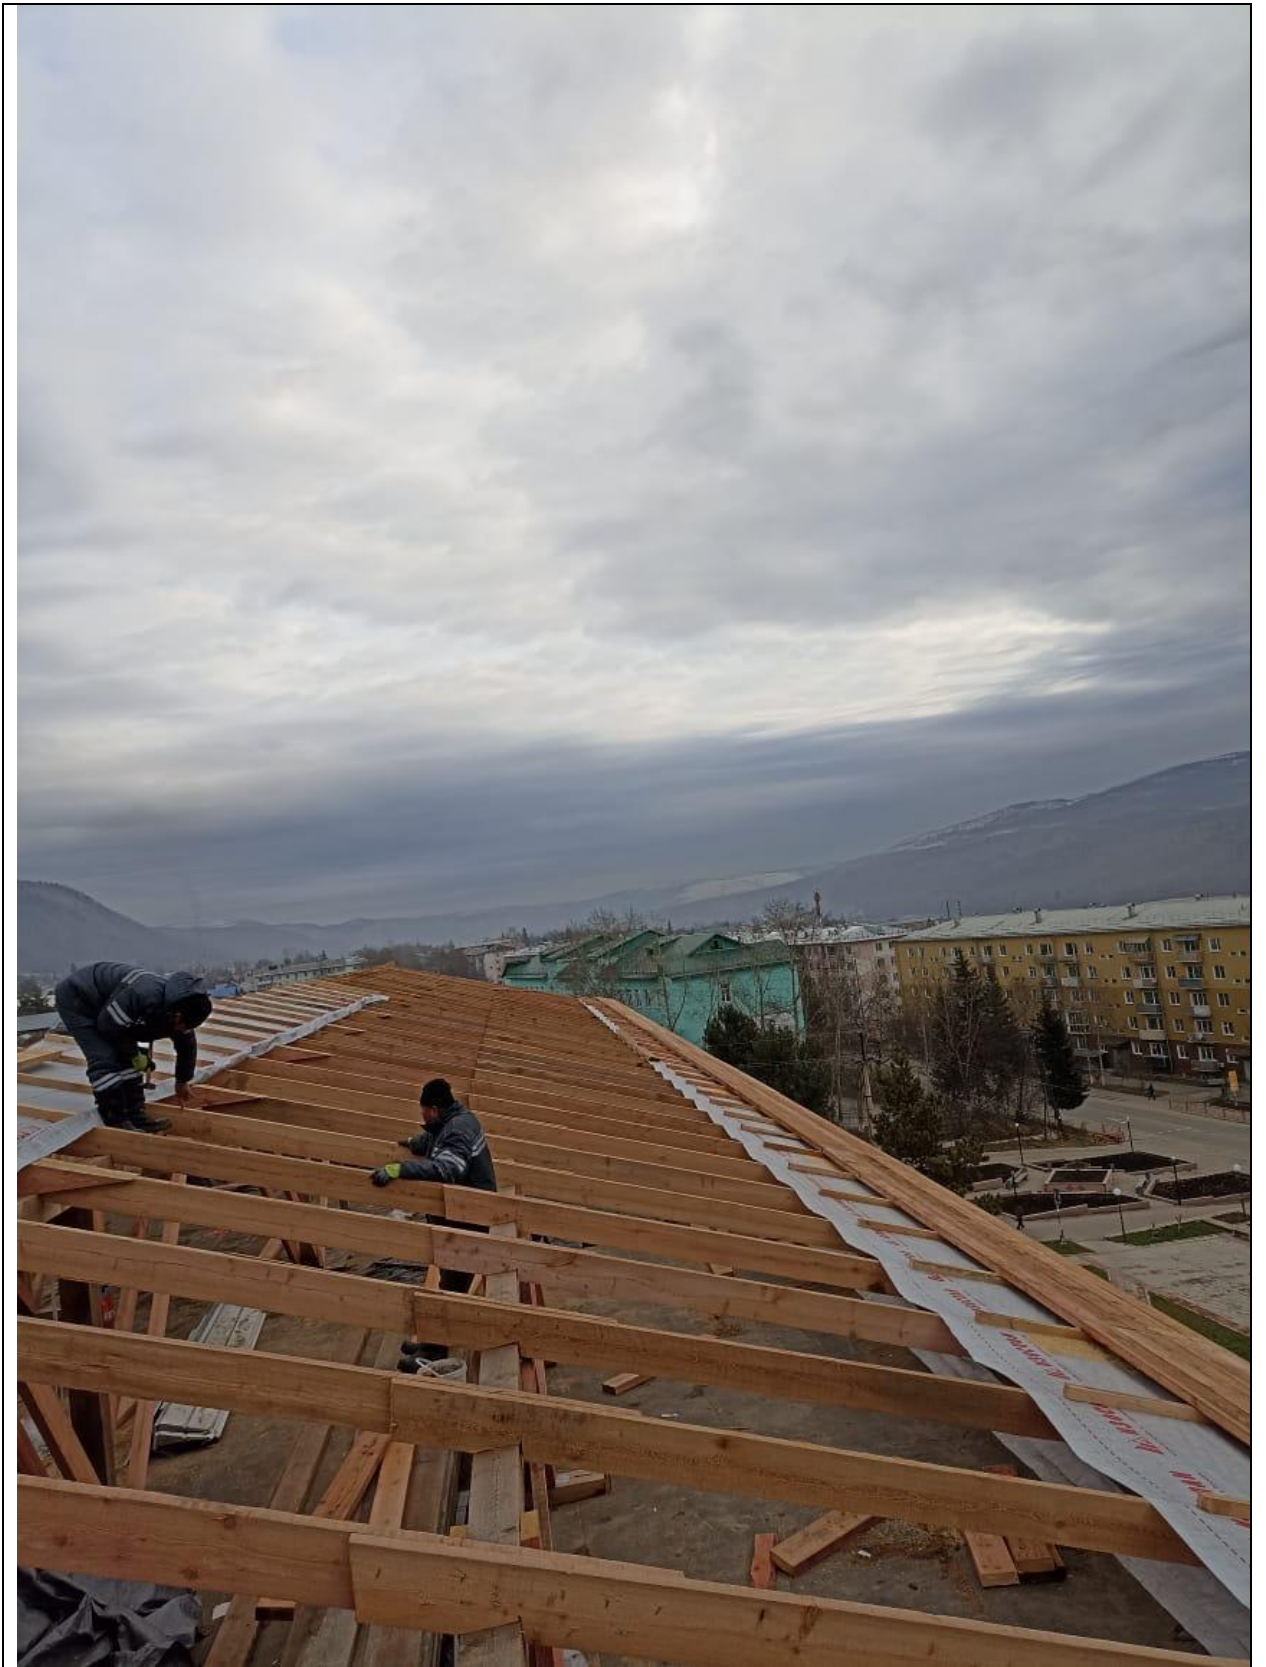

Р13

№№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
33	15.09.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
34	17.09.22	Монтаж стропильной системы на кровле	Смирнов А.А.
35	19.09.22	Монтаж стропильной системы на кровле	Смирнов А.А.
36	21.09.22	Монтаж стропильной системы на кровле	Смирнов А.А.
37	23.09.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
38	25.09.22	Огне-био защитное покрытие	Смирнов А.А.
39	27.09.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
40	29.09.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
41	01.10.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
42	03.10.22	Монтаж стропильной системы	Смирнов А.А.
43	05.10.22	Огне-био защитное покрытие	Смирнов А.А.
44	07.10.22	Монтаж софрита по периметру кровле	Смирнов А.А.
45	09.10.22	Монтаж софрита по периметру кровли	Смирнов А.А.
46	11.10.22	Монтаж софрита по периметру кровли	Смирнов А.А.
47	13.10.22	Монтаж софрита по периметру кровли	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

